



PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Viabilità - Servizio Manutenzione

Progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria di alcune strade della Provincia di Oristano.

- ☐ S.P. n. 9 da fine abitato di San Vero Mills al BV con la SP 15
- ☐ S.P. n. 11 da BV SP 23 a BV SP 32
- ☐ S.P. n. 12 da abitato di Zeddiani ad abitato di Baratili San Pietro
- ☐ S.P. n. 13 da abitato di Narbolla ad abitato di San Vero Mills
- ☐ S.P. n. 35 da abitato di Siamanna ad abitato di Villaurbana
- ☐ S.P. n. 36 da BV SP 35 ad abitato di Ruinas
- ☐ S.P. n. 47 da abitato di Uras ad abitato di San Nicolò d'Arcidano
- ☐ S.P. n. 49 da BV SP 50 (Tanca Marchesa) a BV località Cirras
- ☐ S.P. n. 50 da fine abitato Marrubiu a BV SP 69 (Tanca Marchesa)
- ☐ S.P. n. 54 da BV SP 18 a rotatoria località Rimedio
- ☐ S.P. n. 92 circonvallazione di Terralba
- ☐ S.P. n. 93 da BV via Vandalino Casu a BV SP 54
- ☐ S.P. n. 98 da BV SS 131 a località "Morimenta"

ELABORATO

Cronoprogramma

Allegato:

I

Scala

Data

Luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Giorgio Piras

I PROGETTISTI

- Geom. Careddu Piergiorgio

- Geom. Gian Pietro Meles


IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'


- Ing. Piero Dau

- Geom. Alessandro Serra

Attività	Inizio	Fine	1				2				3				3				22/1	23/1		
			2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	13/1	14/1	15/1	16/1	17/1			18/1	19/1
SP 9. Allestimento cantiere	02/01/2014	02/01/2014																				
SP 9. Lavori di bitumazione. Voci 1 e 2 del computo	02/01/2014	07/01/2014																				
SP 11. Allestimento cantiere	08/01/2014	10/01/2014																				
SP 11. bonifiche. Voce 3 del cmputo	13/01/2014	07/03/2014																				
SP 11. Lavori c/o il viadotto bv Tadasuni. Voci di computo da 4 a 11.	10/03/2014	10/03/2014																				
SP 11. Voci 12 e 13 di computi	11/03/2014	11/03/2014																				
SP 11. segnaletica o. Voce 14 di computo	12/03/2014	13/03/2014																				
SP 11. Smontaggio cantiere	13/03/2014	13/03/2014																				
SP 12. Allestimento cantiere.	14/03/2014	14/03/2014																				
SP 12. Stesura binder. Voce di computo 15.	17/03/2014	20/03/2014																				
SP 12. Smontaggio cantiere	21/03/2014	21/03/2014																				
SP 13. Allestimento cantiere	24/03/2014	24/03/2014																				
SP 13. Lavori di bitumatura. Voci di computo da 16 a 18	25/03/2014	28/03/2014																				
SP 13. Segnaletica or. Voce di computo 19	31/03/2014	03/04/2014																				
SP 13. Smontaggio cantiere	04/04/2014	04/04/2014																				
SP 35. Allestimento cantiere	07/04/2014	08/04/2014																				
SP 35. Lavori di bitumatura. Voci di computo 20 e 24	07/04/2014	09/04/2014																				
SP 35. Risagoma e manutenzioni. Voci di computo da 21 a 23	10/04/2014	17/04/2014																				
SP 35. Segnaletica or.	18/04/2014	22/04/2014																				
SP 35. Smontaggio cantiere	23/04/2014	23/04/2014																				
SP 36. Allestimento cantiere	24/04/2014	30/04/2014																				
SP 36. Risagoma e manutenzioni. Voci di computo da 26 a 28	02/05/2014	05/05/2014																				
SP 36. Bonifiche	06/05/2014	13/05/2014																				
SP 36. Lavori di bitumatura. Voci di computo 30 e 31	14/05/2014	19/05/2014																				
SP 36 Segnaletica or.	20/05/2014	23/05/2014																				
SP 36. Smontaggio cantiere	26/05/2014	26/05/2014																				
SP 47. Allestimento cantiere	27/05/2014	29/05/2014																				
SP 47. Bonifiche	30/05/2014	06/06/2014																				
SP 47. Conglomerato tap.	09/06/2014	09/06/2014																				
SP 47. Segnaletica or.	10/06/2014	10/06/2014																				
SP 47. Smontaggio cantiere	11/06/2014	11/06/2014																				
SP 49. Lavori di bitumatura. Voci di computo da 36 a 39	12/06/2014	16/06/2014																				
SP 49. Segnaletica or.	17/06/2014	19/06/2014																				
SP 49. Smontaggio cantiere	20/06/2014	20/06/2014																				
SP 50. Allestimento e smontaggio cantiere	23/06/2014	23/06/2014																				
SP 50. Lavori di bitumature	24/06/2014	25/06/2014																				
SP 50. Segnaletica orizzontale.	26/06/2014	27/06/2014																				
SP 54. Allestimento e smontaggio cantiere	30/06/2014	30/06/2014																				
SP 54. Lavori di bitumatura	01/07/2014	02/07/2014																				
SP 54. Segnaletica orizzontale	03/07/2014	03/07/2014																				
SP 92. Allestimento e smontaggio cantiere	04/07/2014	04/07/2014																				
SP 92. Bitumatura	07/07/2014	07/07/2014																				
SP 93. Allestimento e smontaggio cantiere	08/07/2014	08/07/2014																				
SP 93. Lavori di bitumatura	08/07/2014	09/07/2014																				
SP 98. Allestimento cantiere	10/07/2014	11/07/2014																				
SP 98. Bonifiche e bitumature	14/07/2014	29/07/2014																				
SP 98. Smontaggio cantiere	30/07/2014	30/07/2014																				

4		5		5		6		7		8		8		9		10																									
24/1	25/1	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2	8/2	9/2	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2	17/2	18/2	19/2	20/2	21/2	22/2	23/2	24/2	25/2	26/2	27/2	28/2	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	

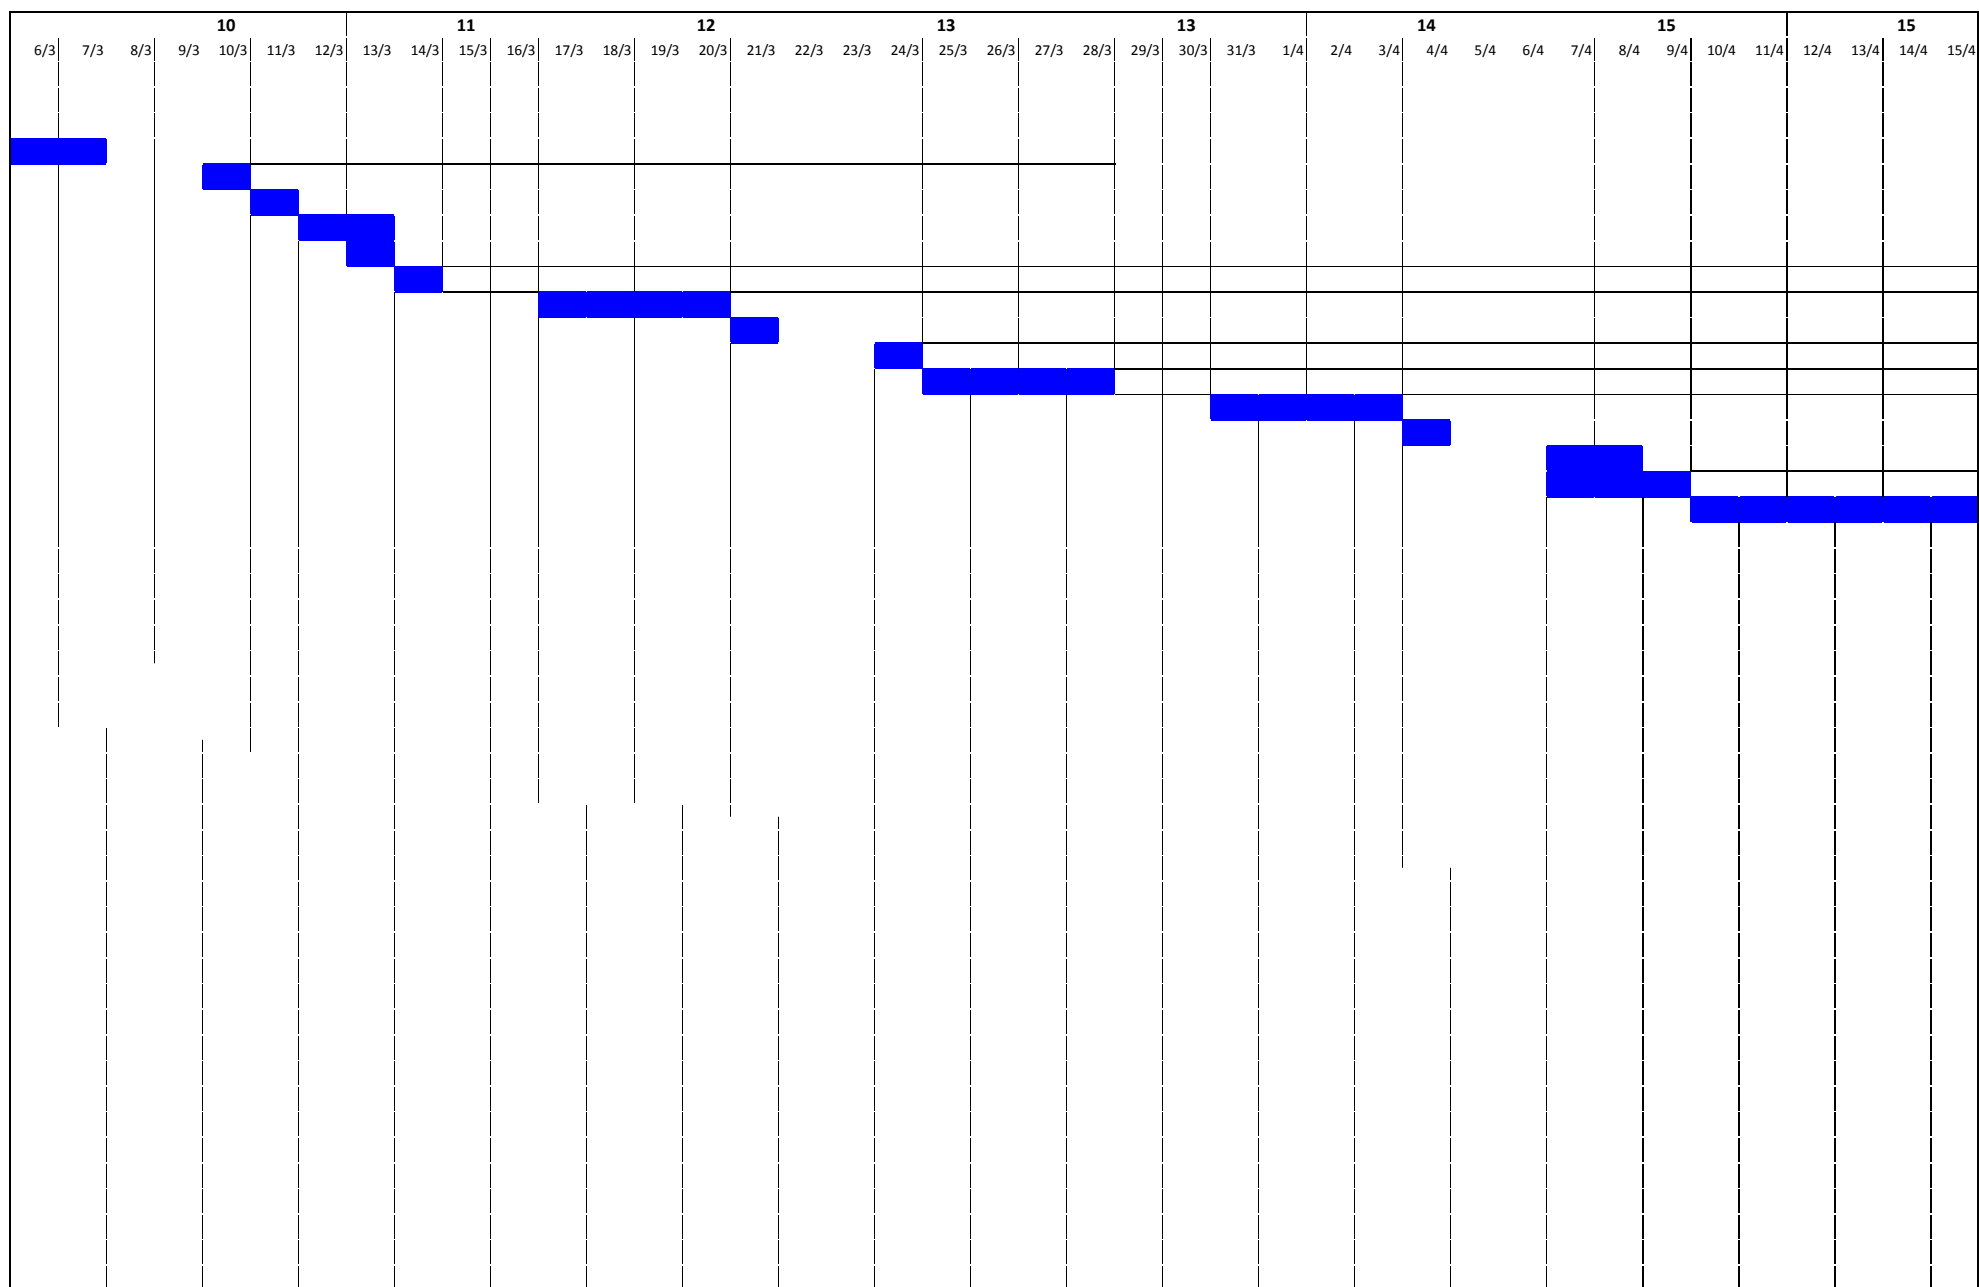

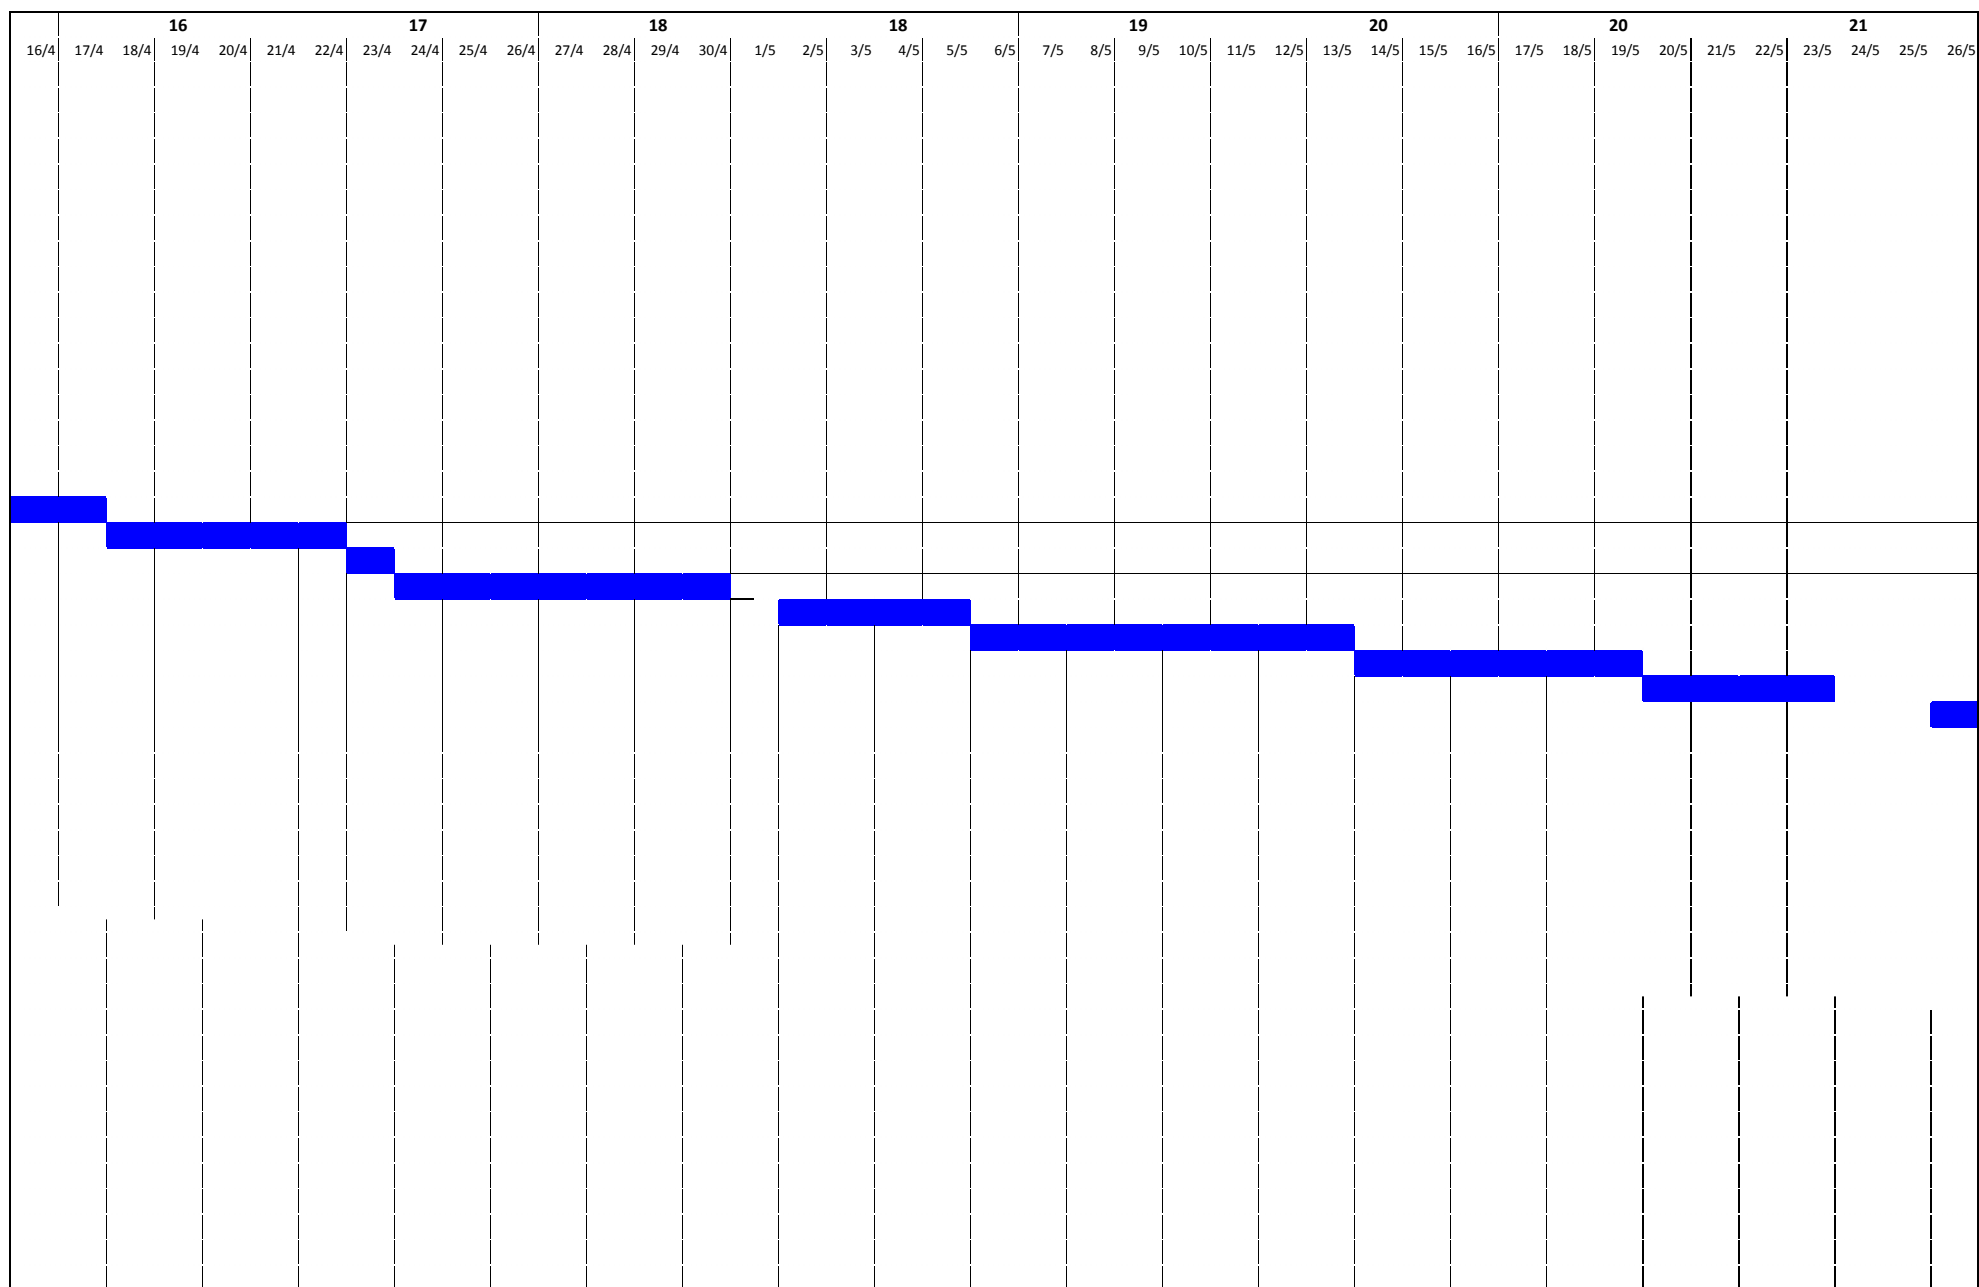

22					23					23					24					25					25					26					27																			
27/5	28/5	29/5	30/5	31/5	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6	8/6	9/6	10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6	17/6	18/6	19/6	20/6	21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7														

[illegible]
